



Risk Management
Manajemen Risiko

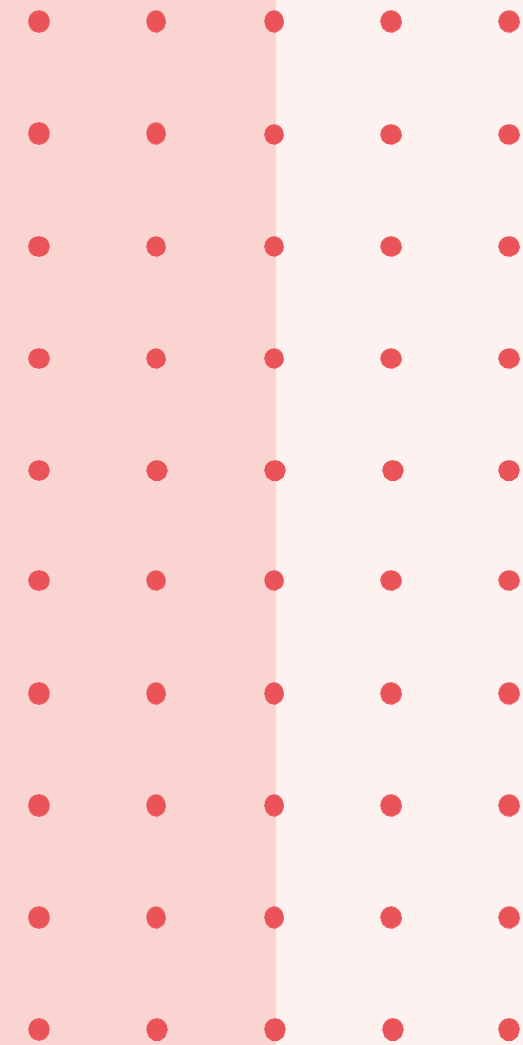

Materi


- Pengenalan Manajemen Risiko
- Proses dalam Manajemen Risiko
- Penanganan risiko
- Cara menghadapi risiko

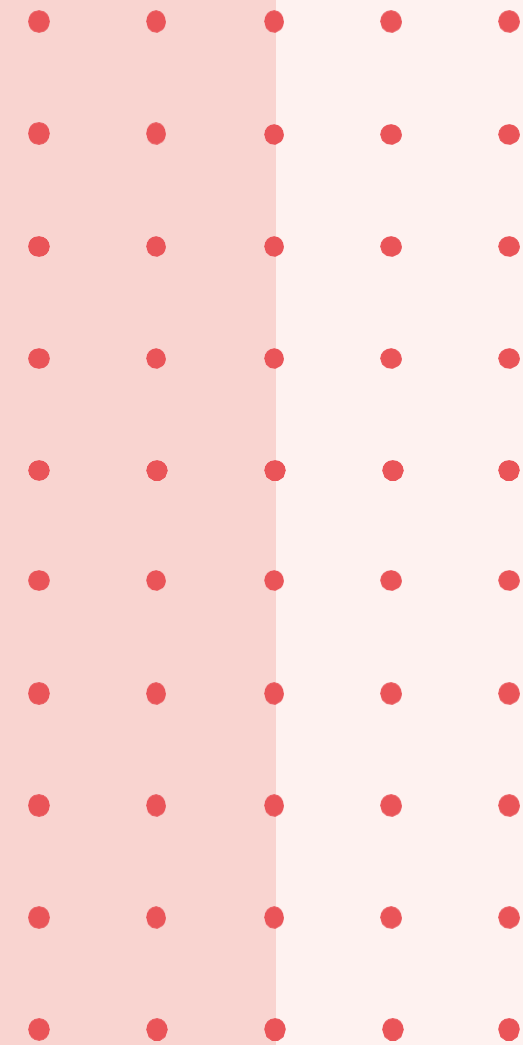

Manajemen Risiko


Manajemen Risiko - adalah proses **identifikasi, analisis**, dan **respons terhadap risiko** yang dapat mempengaruhi tujuan proyek. Tujuannya adalah untuk **meminimalkan dampak negatif** dan **memaksimalkan peluang** yang muncul dari risiko.

Risk MANAGEMENT PROCESSES

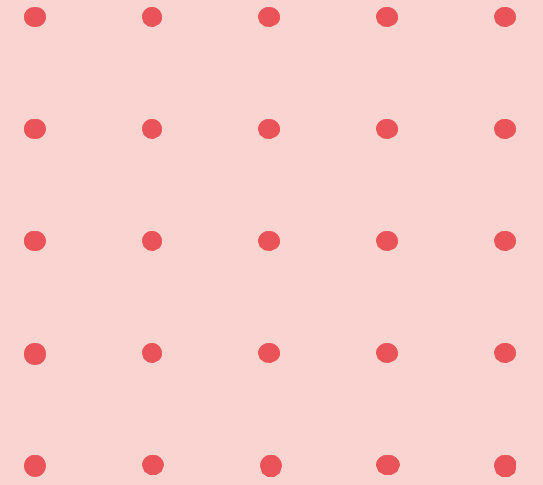

Proses-proses dalam manajemen risiko:

1. Rencana Manajemen Risiko (Plan Risk Management)
2. Identifikasi Risiko (Identify Risks)
3. Analisis Risiko Kualitatif (Perform Qualitative Risk Analysis)
4. Analisis Risiko Kuantitatif (Perform Quantitative Risk Analysis)
5. Rencana Respons Risiko (Plan Risk Responses)
6. Implementasi Respons Risiko (Implement Risk Responses)
7. Pemantauan Risiko (Monitor Risks)

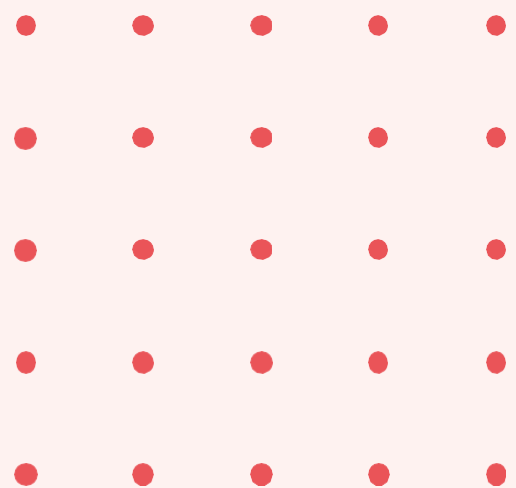

Rencana Manajemen Risiko

Deskripsi:

Langkah awal ini melibatkan penyusunan rencana manajemen risiko, yang merupakan komponen dari rencana manajemen proyek secara keseluruhan. Ini mencakup hal-hal seperti mengidentifikasi kategori risiko (pasar, pengadaan, sumber daya, dll.), menentukan waktu dan prosedur untuk mengevaluasi kembali risiko, serta mendefinisikan probabilitas dan dampak risiko.

- **Tujuan:** Menetapkan rencana manajemen risiko yang jelas agar seluruh tim memiliki pemahaman yang sama tentang pendekatan manajemen risiko.
- **Input:** Dokumen proyek (misalnya, Project Charter), Kebijakan organisasi tentang manajemen risiko
- **Output:** Rencana manajemen risiko, Kebijakan dan prosedur yang mendukung manajemen risiko

Identifikasi Risiko

Deskripsi:

Nilai dalam manajemen risiko terletak pada **daftar risiko potensial** terhadap **biaya** dan **jadwal**, yang dapat disusun dengan menggunakan **checklist**, **expert judgement**, dan **previous project experience**. Selain itu, penting untuk **mengenali peluang** sebagai kebalikan dari risiko, karena mengidentifikasi peluang ini dapat membawa penghematan biaya atau jadwal.

- **Tujuan:** Mengidentifikasi semua risiko yang dapat berdampak pada pencapaian tujuan proyek.
- **Input:** Rencana manajemen risiko, Dokumen proyek, Wawancara dengan pemangku kepentingan
- **Output: Daftar risiko (Risk Register)**, Basis data risiko


Referensi: <https://www.projectengineer.net/wp-content/uploads/2015/02/pmbok-process-identify-risks.png>

Analisis Risiko Kualitatif

Deskripsi:

Langkah ini melibatkan **prioritisasi risiko**. Karena risiko memiliki dua komponen—**probabilitas terjadinya** dan **dampak**—setiap faktor ini harus diprioritaskan pada skala, misalnya, 1-10. Skala tinggi-sedang-rendah juga bekerja dengan baik. Setiap risiko dalam daftar risiko dianalisis dan diberikan peringkat untuk kedua variabel tersebut. Kemudian, peringkat prioritas risiko keseluruhan ditemukan

- **Tujuan:** Memprioritaskan risiko untuk menentukan mana yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam perencanaan respons.
- **Input:** Daftar risiko, Rencana manajemen risiko
- **Output:** Penilaian risiko, Kategorisasi risiko (tinggi, sedang, rendah)

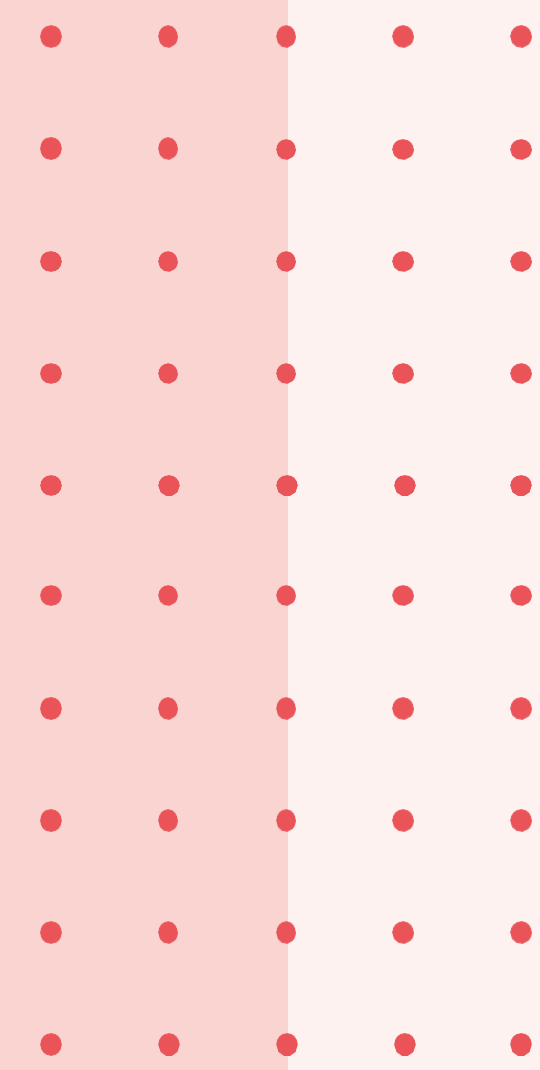

Analisis Risiko Kuantitatif

Deskripsi:

Dengan menggunakan prioritas risiko yang ditetapkan selama langkah Analisis Risiko Kualitatif sebelumnya, dampaknya terhadap jadwal dan anggaran proyek ditentukan. Setiap tugas diberikan estimasi probabilitas untuk berbagai skenario, misalnya 90%, 50%, dan 10% kemungkinan. Distribusi gaya bell-curve juga dapat digunakan. Kemudian, probabilitas untuk memenuhi keseluruhan biaya dan jadwal dihitung. Teknik ini disebut analisis Monte Carlo, meskipun metode lain juga valid.

Ini adalah langkah yang kompleks yang umumnya memerlukan perangkat lunak dan lebih cocok untuk proyek-proyek besar.

- **Tujuan:** Memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang risiko dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi proyek secara keseluruhan.
- **Input:** Daftar risiko (Risk Register), Hasil dari analisis kualitatif
- **Output:** Model risiko, Estimasi dampak risiko pada proyek (misalnya, biaya, jadwal)


Referensi: <https://www.projectengineer.net/wp-content/uploads/2015/02/pmbok-process-perform-quantitative-risk-analysis.png>

Rencana Respon Risiko

Deskripsi:

Pada langkah ini, Anda mengambil risiko-risiko terpenting untuk proyek dan membuat rencana tindakan, tidak hanya untuk merespons risiko jika terjadi, tetapi juga untuk memantau pemicu risiko sehingga Anda mendapatkan peringatan sedini mungkin.

- **Tujuan:** Menciptakan rencana yang jelas untuk menangani risiko yang teridentifikasi, baik dengan mengurangi dampak negatif maupun memanfaatkan peluang.
- **Input:** Penilaian risiko, Daftar risiko, Rencana manajemen risiko
- **Output:** Rencana respons risiko, Tindakan mitigasi

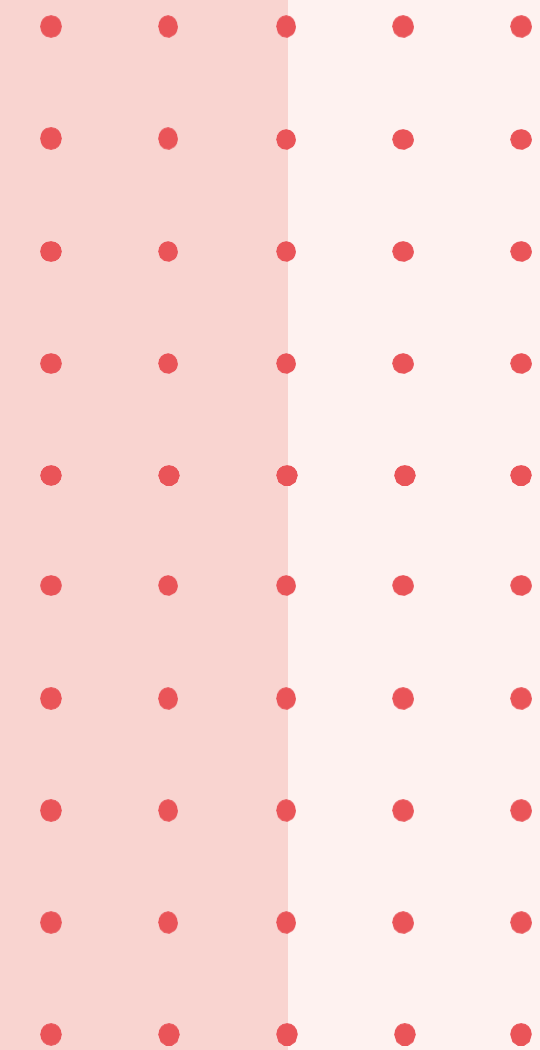

Referensi: <https://www.projectengineer.net/wp-content/uploads/2015/02/pmbok-process-plan-risk-responses.png>

Implementasi Respon Risiko

Deskripsi:

Ketika suatu peristiwa risiko terjadi, rencana respons segera diaktifkan. Proses ini berlangsung selama fase pelaksanaan proyek dan memerlukan keterampilan interpersonal dan kepemimpinan yang baik. Setelah respons risiko, log isu, daftar risiko, dan daftar pelajaran yang dipelajari diperbarui.

- **Tujuan:** Menjamin bahwa semua langkah yang diperlukan untuk menangani risiko dilaksanakan dengan baik.
- **Input:** Rencana respons risiko, Dokumen proyek
- **Output:** Tindakan mitigasi yang diimplementasikan, Perubahan pada dokumen proyek (jika perlu)


Referensi: <https://www.projectengineer.net/wp-content/uploads/2015/02/pmbok-process-implement-risk-responses.png>

Pemantauan Risiko

Deskripsi:

Sepanjang proyek, daftar risiko dipantau untuk memastikan analisis tetap terkini. Risiko selalu dapat berakhir dan dapat diberi label sebagai "tidak terjadi." Selain itu, prioritas risiko dapat berubah karena banyak hal yang dapat terjadi selama proyek yang mengubah profil risiko (probabilitas, dampak) dari setiap risiko. Re-analisis risiko mungkin menghasilkan prioritas yang berbeda atau memerlukan rencana respons risiko yang diperbarui.

- **Tujuan:** Memastikan bahwa risiko dikelola secara proaktif dan bahwa respons yang telah diimplementasikan efektif.
- **Input:** Rencana manajemen risiko, Daftar risiko, Hasil dari implementasi respons risiko
- **Output:** Laporan status risiko, Rencana yang diperbarui berdasarkan risiko baru atau perubahan yang teridentifikasi

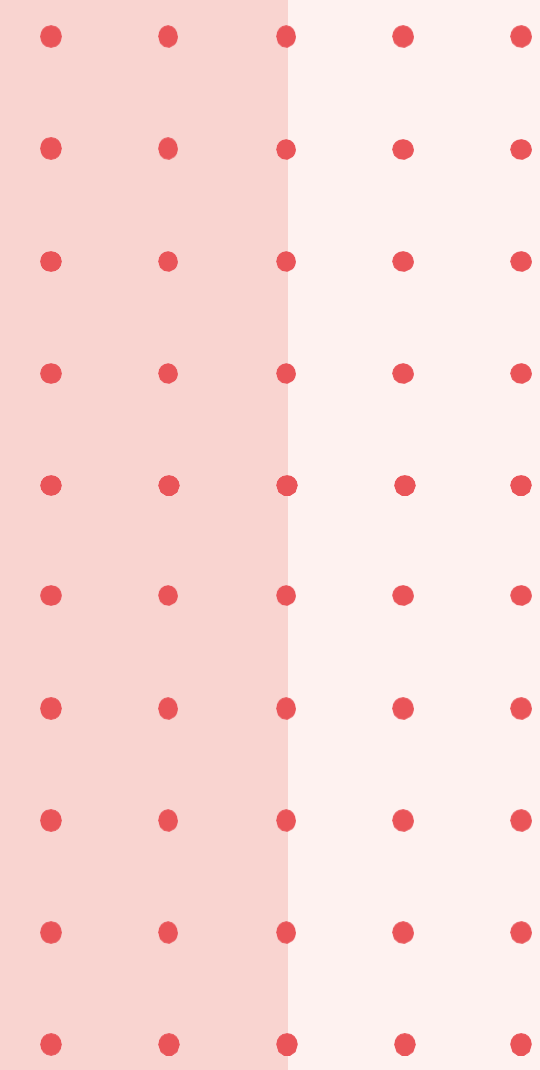

Cara-cara Menghadapi Risiko

a. Risk Avoidance

Yaitu memutuskan untuk **tidak melakukan aktivitas yang mengandung resiko sama sekali**. Dalam memutuskan untuk melakukannya, maka harus dipertimbangkan potensial keuntungan dan potensial kerugian yang dihasilkan oleh suatu aktivitas.

b. Risk Reduction

Risk reduction atau disebut juga **risk mitigation** yaitu merupakan metode yang **mengurangi kemungkinan terjadinya** suatu resiko ataupun **mengurangi dampak** kerusakan yang dihasilkan oleh suatu resiko.

c. Risk Transfer

Yaitu **memindahkan resiko pada pihak lain**, umumnya melalui suatu kontrak (asuransi) maupun hedging.

d. Risk Deferral

Dampak suatu resiko tidak selalu konstan. Risk deferral meliputi **menunda aspek** suatu proyek hingga saat dimana probabilitas terjadinya resiko tersebut kecil.

• • • • •


e. Risk Retention

Walaupun resiko tertentu dapat dihilangkan dengan cara mengurangi maupun mentransfernya, namun beberapa resiko **harus tetap diterima** sebagai bagian penting dari aktivitas.


• • • • •

Penanganan Risiko


a.High probability, high impact: risiko jenis ini umumnya dihindari ataupun ditransfer.




b.Low probability, high impact: respon paling tepat untuk tipe risiko ini adalah dihindari. Dan jika masih terjadi, maka lakukan mitigasi risiko serta kembangkan *contingency plan*.



c.High probability, low impact: mitigasi risiko dan kembangkan contingency plan.



d.Low probability, low impact: efek dari resiko ini dapat dikurangi, namun biayanya dapat saja melebihi dampak yang dihasilkan. Dalam kasus ini mungkin lebih baik untuk menerima efek dari resiko tersebut.



Cara-cara Menghadapi Risiko

a. Risk Avoidance

Yaitu memutuskan untuk **tidak melakukan aktivitas yang mengandung resiko sama sekali**. Dalam memutuskan untuk melakukannya, maka harus dipertimbangkan potensial keuntungan dan potensial kerugian yang dihasilkan oleh suatu aktivitas.

b. Risk Reduction

Risk reduction atau disebut juga **risk mitigation** yaitu merupakan metode yang **mengurangi kemungkinan terjadinya** suatu resiko ataupun **mengurangi dampak** kerusakan yang dihasilkan oleh suatu resiko.

c. Risk Transfer

Yaitu **memindahkan resiko pada pihak lain**, umumnya melalui suatu kontrak (asuransi) maupun hedging.

d. Risk Deferral

Dampak suatu resiko tidak selalu konstan. Risk deferral meliputi **menunda aspek** suatu proyek hingga saat dimana probabilitas terjadinya resiko tersebut kecil.

• • • • •


e. Risk Retention

Walaupun resiko tertentu dapat dihilangkan dengan cara mengurangi maupun mentransfernya, namun beberapa resiko **harus tetap diterima** sebagai bagian penting dari aktivitas.


• • • • •

BONUS:

**Penerapan Risk
Management**

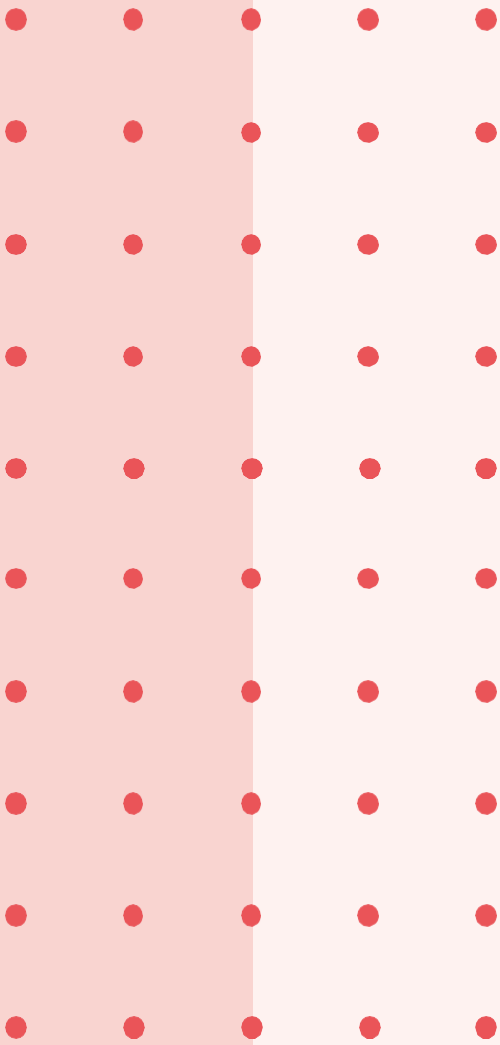

Thanks!

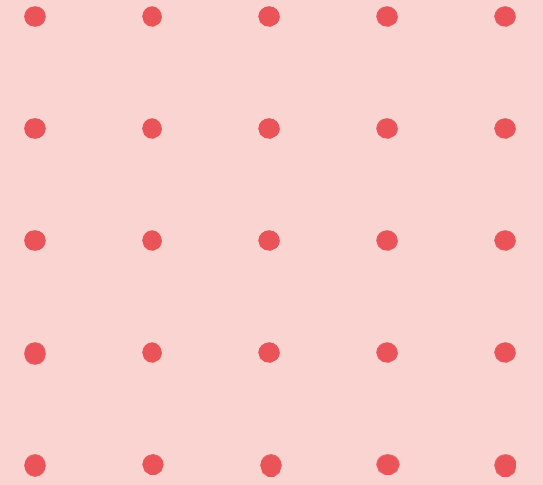

Do you have any
questions?
