



Cost Management
Manajemen Biaya

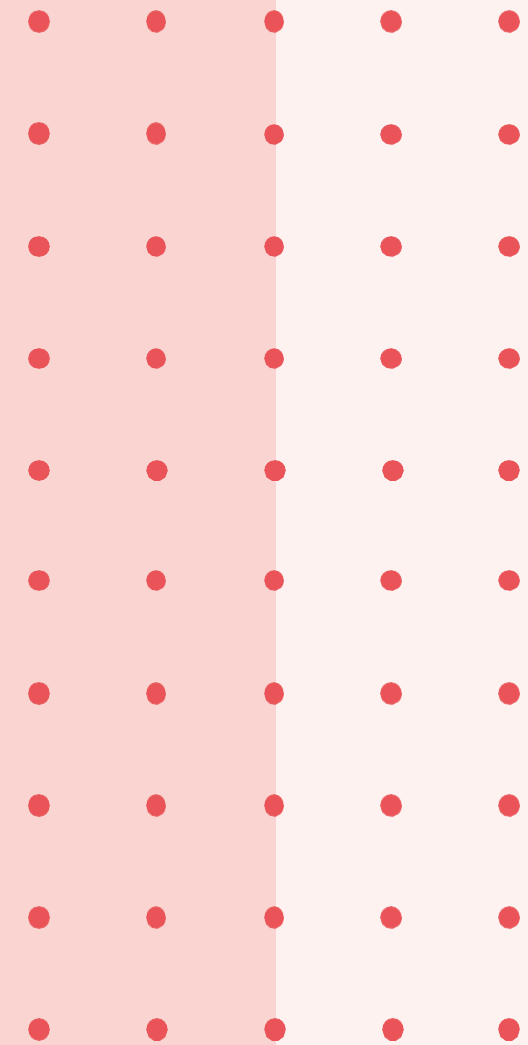

Pramana Yoga Saputra

Materi

- Pengenalan Manajemen Biaya
- Manfaat Manajemen Biaya
- Proses dalam Manajemen Biaya

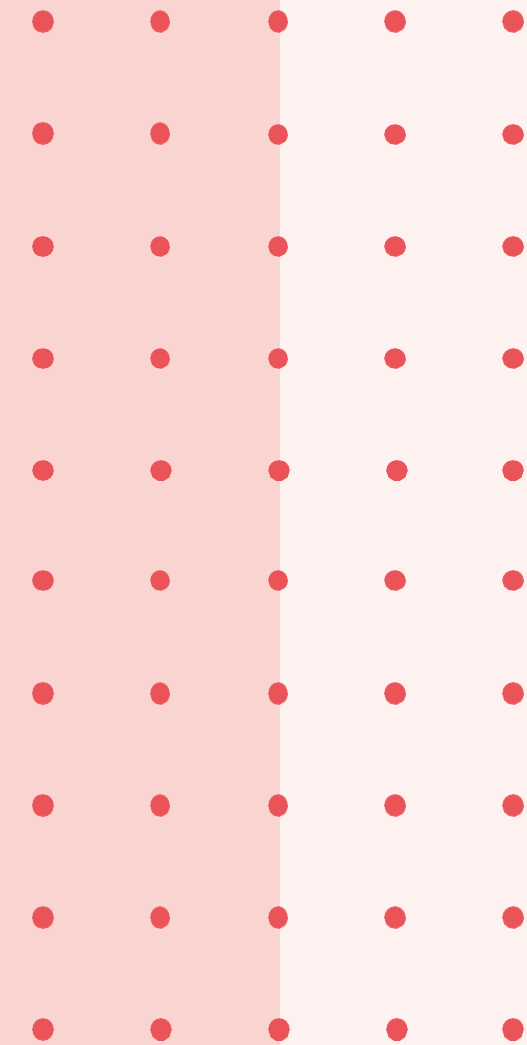


Manajemen Biaya

Manajemen Biaya - proses **mengestimasi, menganggarkan, dan mengendalikan biaya proyek**. Proses manajemen biaya dimulai pada fase **perencanaan** dan berlanjut selama durasi proyek. Manajer proyek terus-menerus **meninjau, memantau, dan menyesuaikan** pengeluaran untuk **memastikan** proyek **tidak melebihi anggaran** yang disetujui.

Manfaat Manajemen Biaya



- 1. Pengendalian Anggaran:** Manajemen biaya membantu memastikan bahwa proyek tetap dalam anggaran yang ditetapkan, sehingga menghindari pembengkakan biaya yang dapat membahayakan kelangsungan proyek.
- 2. Perencanaan yang Efektif:** Dengan estimasi biaya yang akurat, tim proyek dapat merencanakan dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
- 3. Transparansi dan Kepercayaan:** Manajemen biaya yang baik menciptakan transparansi mengenai pengeluaran proyek. Ini meningkatkan kepercayaan antara pemangku kepentingan, termasuk klien dan tim proyek.
- 4. Peningkatan Kinerja Proyek:** Dengan memantau biaya secara rutin, tim dapat mengidentifikasi masalah lebih awal dan mengambil tindakan korektif, sehingga meningkatkan kinerja keseluruhan proyek.
- 5. Menghindari Kerugian Finansial:** Proyek yang tidak dikelola biayanya dengan baik dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi organisasi. Manajemen biaya membantu mengurangi risiko tersebut.
- 6. Kepuasan Klien:** Ketika proyek selesai sesuai anggaran dan waktu, klien cenderung lebih puas. Hal ini dapat meningkatkan reputasi organisasi dan peluang untuk proyek di masa depan.

COST MANAGEMENT PROCESSES

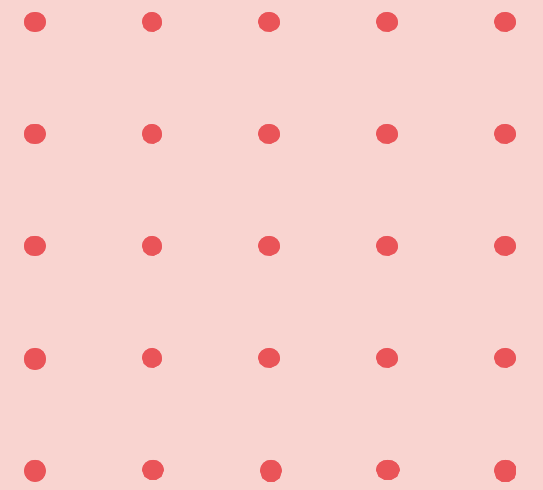

Proses-proses dalam manajemen biaya:

1. Perencanaan Manajemen Biaya (Plan Cost Management)
2. Estimasi Biaya (Estimate Costs)
3. Menentukan Anggaran (Determine Budget)
4. Pengendalian Biaya (Control Costs)

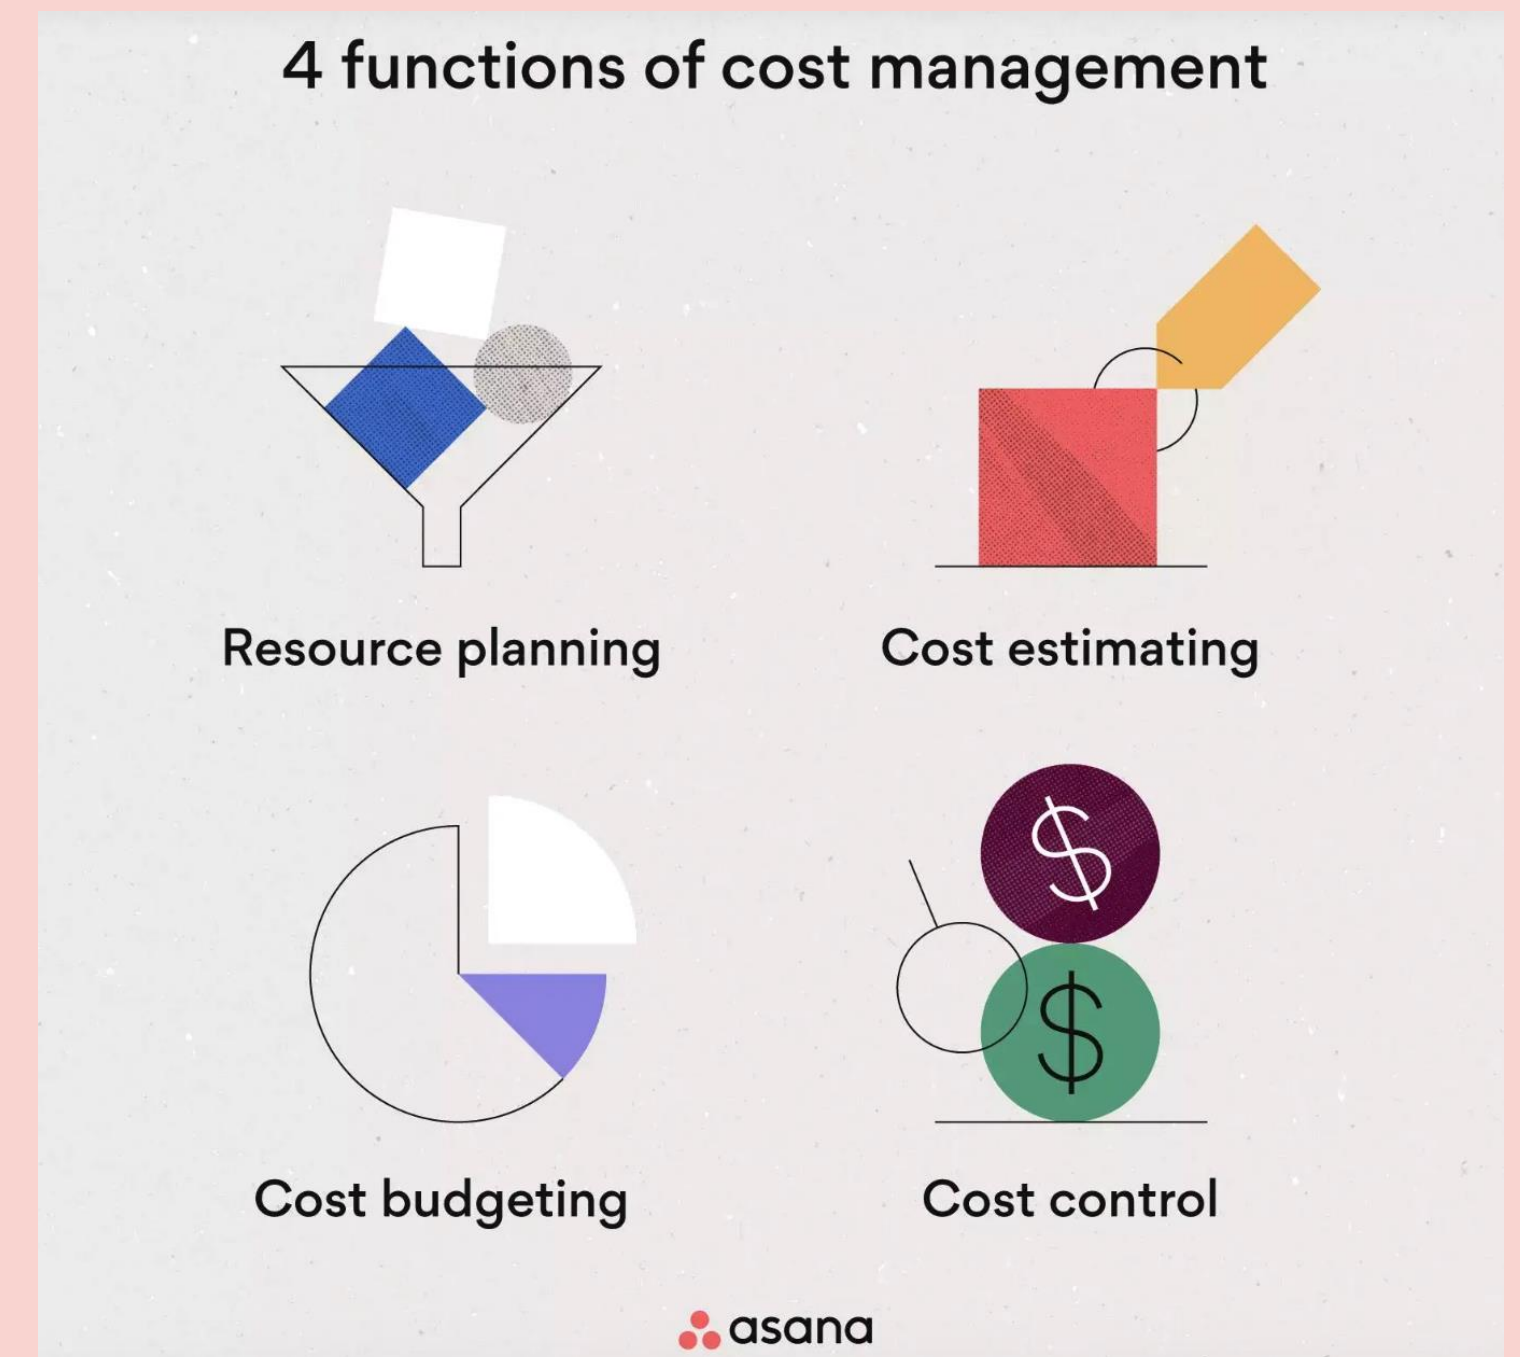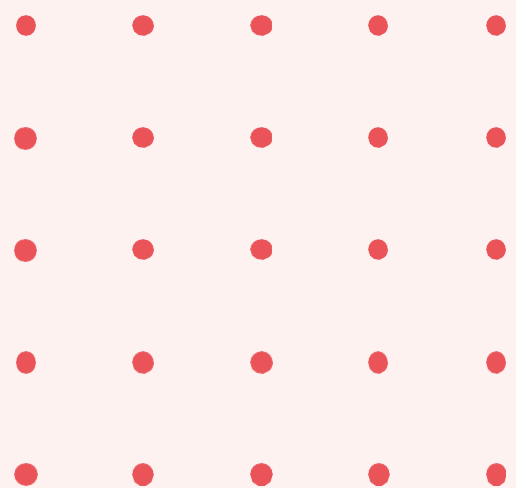


Perencanaan Manajemen Biaya (Plan Cost Management)

Deskripsi:

Langkah pertama dalam manajemen biaya adalah perencanaan sumber daya, di mana manajer biaya meninjau lingkup dan spesifikasi proyek untuk menentukan kebutuhan sumber daya.

Sumber daya mencakup alat, uang, waktu, peralatan, dan anggota tim. Untuk membuat rencana sumber daya yang akurat, penting untuk berkonsultasi dengan pemimpin tim dan pemangku kepentingan yang memiliki pengalaman di bidangnya.

- **Tujuan:** Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk manajemen biaya yang jelas agar seluruh tim proyek memahami bagaimana biaya akan diestimasi dan dikelola.
- **Input:** Proyek dokumen (charter proyek, rencana manajemen proyek), Lingkup proyek
- **Output:** Rencana manajemen biaya

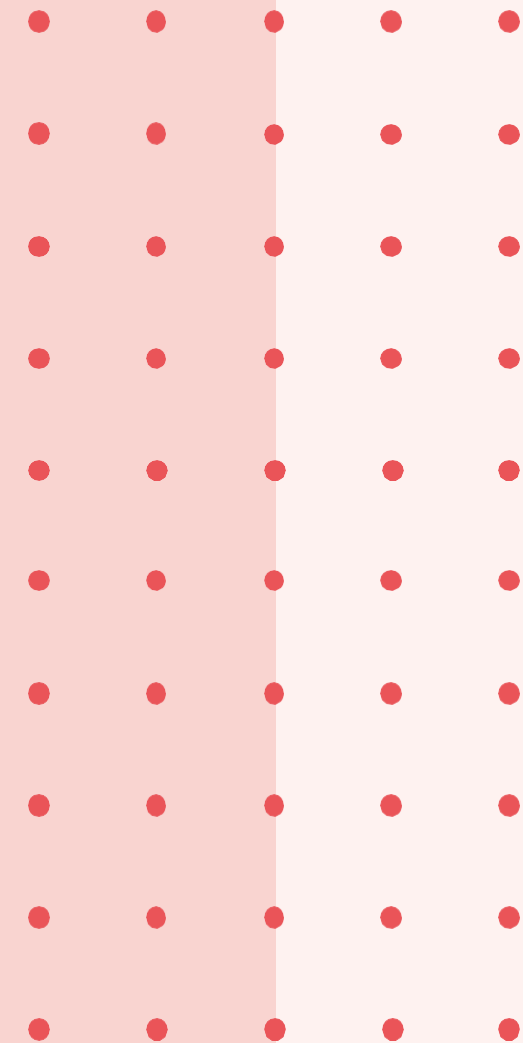

Estimasi Biaya(Estimate Costs)

Deskripsi:

Setelah memiliki daftar sumber daya yang diperlukan, langkah berikutnya adalah **memperkirakan biaya** pengadaannya. Kumpulkan informasi harga sebanyak mungkin untuk membuat estimasi yang akurat.

Untuk **sumber daya fisik**, dapatkan **kutipan harga dari penjual**, dan **gunakan perangkat lunak manajemen inventaris** untuk data harga real-time. Untuk **biaya tenaga kerja**, peroleh beberapa **kutipan dari kontraktor** untuk mendapatkan gambaran realistis tentang biaya.

Sisakan ruang untuk **kemungkinan kenaikan harga** dan **tambahkan buffer 5–10%** untuk **pengeluaran tak terduga**. Jika ini adalah **pengalaman pertama** Anda dengan tim proyek, **periksa laporan anggaran** dari manajer biaya **sebelumnya** untuk melihat deviasi biaya akhir dari estimasi. Gunakan data tersebut sebagai tolok ukur untuk estimasi Anda.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- **Tujuan:** Menghasilkan estimasi biaya yang akurat untuk membantu dalam penganggaran proyek.
- **Input:** Rencana manajemen biaya, Lingkup proyek, Basis data historis dan informasi pasar
- **Output:** Estimasi biaya, Basis data estimasi


Menentukan Anggaran (Determine Budget)

Deskripsi:

Setelah memiliki **estimasi** kebutuhan proyek, Anda dapat **mulai menyusun anggaran proyek**, yang merupakan **rencana rinci** mengenai berapa banyak yang akan **dibelanjakan**, untuk apa, dan kapan.

Untuk proyek multi-tahun, tentukan alokasi biaya agar tidak lebih dari 30% anggaran dihabiskan pada tahun pertama. Ini membantu mencegah pembengkakan biaya di kemudian hari.

- **Tujuan:** Membangun baseline biaya yang akan digunakan untuk memantau kinerja proyek terhadap anggaran.
- **Input:** Estimasi biaya, Rencana manajemen biaya, Lingkup proyek
- **Output:** Anggaran proyek, Baseline biaya

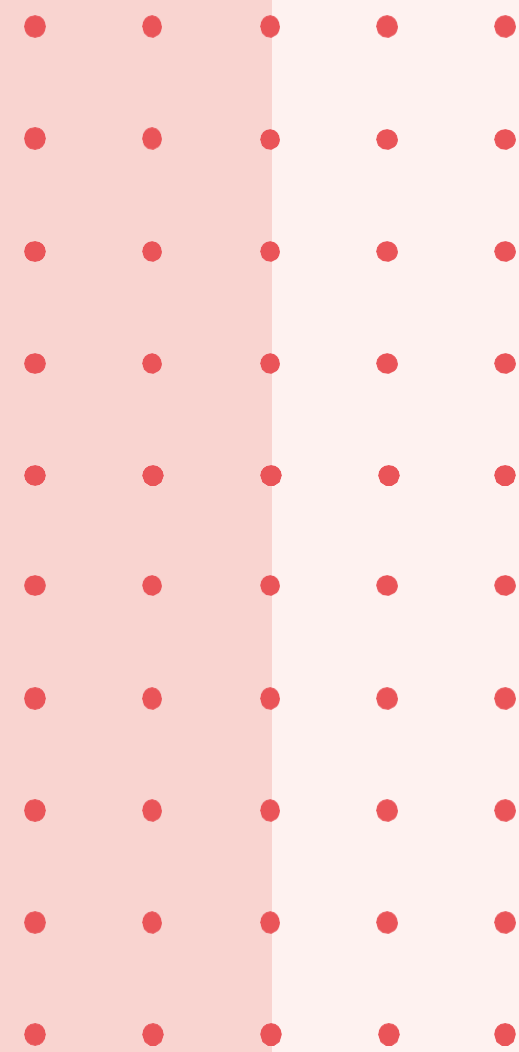


Pengendalian Biaya (Cost Control)

Deskripsi:

Sebagian besar proses manajemen biaya adalah pengendalian biaya, yang meliputi pencatatan dan akuntansi biaya selama proyek, penyesuaian, dan pemberitahuan kepada pemangku kepentingan tentang masalah yang muncul. Tujuannya adalah membandingkan biaya aktual dengan anggaran dan estimasi awal untuk menjaga proyek tetap sesuai rencana.

Frekuensi tinjauan biaya tergantung pada proyek; bisa dilakukan secara real-time, bulanan, atau triwulanan. Pastikan untuk berbagi pembaruan biaya melalui laporan status proyek.

Perubahan pada lingkup proyek dapat memengaruhi anggaran, jadi perhatikan perluasan lingkup. Jika biaya menyimpang terlalu jauh dari anggaran, segera beri tahu pemangku kepentingan untuk merumuskan rencana tindakan.

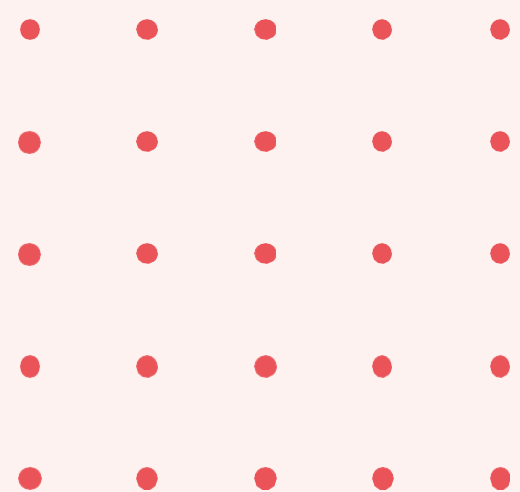

- **Tujuan:** Menjamin bahwa proyek tetap dalam batas anggaran dan melakukan tindakan korektif jika terdapat penyimpangan.
- **Input:** Anggaran proyek, Basis data kinerja proyek, Laporan kinerja
- **Output:** Laporan kinerja biaya, Proyeksi biaya


5 Common Cost Management Problems

	
Budget is too small.	Make sure your budget is realistic at project start.
Cost estimates are inaccurate.	Gather as much real pricing data as possible from authoritative sources.
Teams request unplanned resources.	Talk directly with teams during the resource planning stage, and enforce budget limits once the project begins.
Project is behind schedule, which will increase costs if not corrected.	Communicate clearly with team leads and project managers, and make sure all stakeholders understand that delays will increase costs.
Client keeps adding requests and features to project specs, which drives up costs.	Provide the client with a specific process for submitting change orders, and include a step for cost re-estimation.

POST-PROJECT Cost Accounting

Setelah **proyek selesai**, **hitung varians biaya** untuk **mengevaluasi** seberapa jauh **proyek menyimpang** dari **anggaran dan estimasi awal**. Proyek yang **sukses** biasanya **berakhir dekat dengan anggaran yang diperkirakan**. Jika Anda **menghabiskan terlalu banyak**, mungkin Anda **meremehkan anggaran** atau menghadapi **pengeluaran tak terduga**. Lakukan evaluasi untuk mencegah hal ini di masa depan.

Sebaliknya, jika Anda **menghabiskan terlalu sedikit**, berarti **proses penganggaran biaya** Anda **tidak akurat**. Catat informasi ini sebagai data historis untuk meningkatkan akurasi di proyek mendatang.

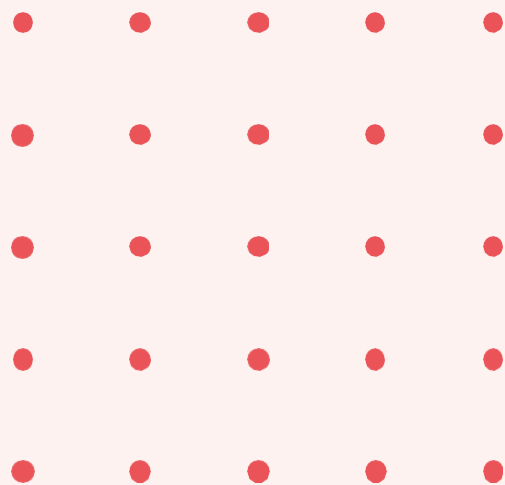

HOW to Calculate Project Cost

Untuk menjaga proyek tetap menguntungkan dan sesuai anggaran, penting memahami cara menghitung biaya proyek. Berikut adalah beberapa metode perhitungan biaya:

1. Per Jam

Deskripsi: Membayar berdasarkan jam kerja.

Contoh: Tim pengembangan perangkat lunak bekerja 100 jam dengan tarif \$100/jam, total \$10,000.

2. Tarif Tetap

Deskripsi: Menetapkan biaya total di awal.

Contoh: Agensi pemasaran mengenakan tarif tetap \$20,000 untuk kampanye.

3. Biaya Plus


Deskripsi: Menghitung biaya aktual ditambah markup.

Contoh: Kontraktor mengenakan \$50,000 untuk material dan tenaga kerja, plus markup 20%, total \$60,000.

4. Penetapan Harga Berdasarkan Nilai

Deskripsi: Fokus pada nilai yang diterima klien.

Contoh: Konsultan mengenakan biaya 10% dari peningkatan pendapatan klien sebesar \$1 juta, yaitu \$100,000.

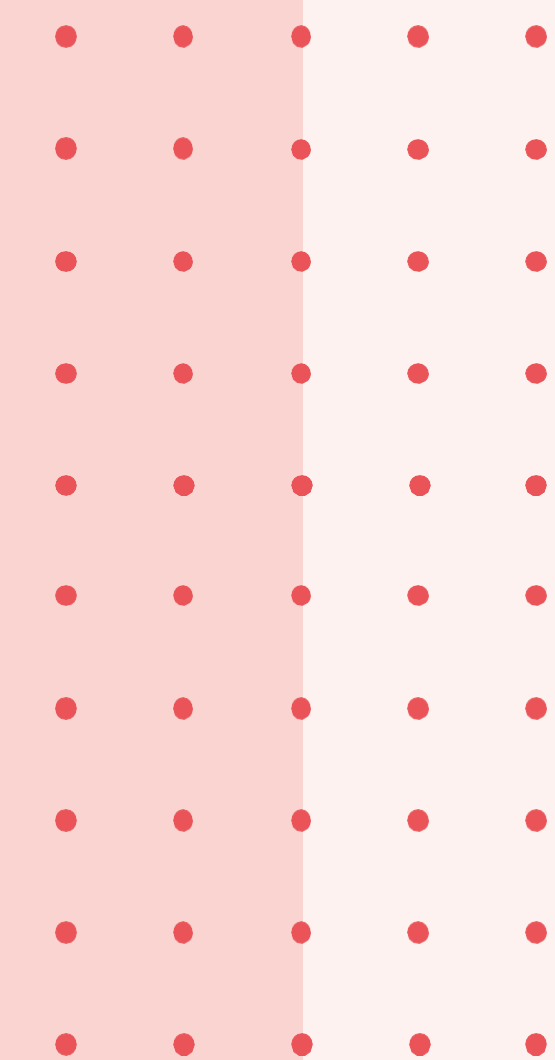

Effective Project Cost Management Methods

Top-Down Estimating

Deskripsi: Mengestimasi total biaya proyek terlebih dahulu, kemudian mendetailkan biaya individu dari total tersebut.

Kegunaan: Baik untuk tahap awal perencanaan proyek ketika informasi rinci belum tersedia.

Contoh: Mengestimasi total biaya proyek pengembangan perangkat lunak sebesar \$200,000 dan membaginya ke dalam segmen seperti desain, pengkodean, dan pengujian.

Bottom-Up Estimating

Deskripsi: Mengestimasi biaya tugas atau komponen proyek terlebih dahulu, kemudian menjumlahkannya untuk mendapatkan total biaya proyek.

Kegunaan: Lebih akurat dan dapat diandalkan, ideal untuk proyek dengan ruang lingkup yang terdefinisi dengan baik.

Contoh: Dalam proyek konstruksi, setiap bagian proyek seperti pondasi dan listrik diestimasi secara rinci sebelum dijumlahkan.

Three-point Estimating


Deskripsi: Menggunakan tiga skenario—optimis, pesimis, dan paling mungkin—untuk menentukan estimasi yang lebih realistis.

Kegunaan: Memberikan rentang hasil yang mungkin, meningkatkan prediktabilitas proyek.


Contoh: Dalam proyek pengembangan produk, mengestimasi durasi fase desain sebagai 30 hari (optimis), 45 hari (paling mungkin), dan 60 hari (pesimis) untuk menetapkan anggaran dan waktu yang realistis.

BONUS:
Research About Project Cost Estimation

ESTIMASI BIAYA PROYEK
PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK
KEPEMERINTAHAN BERSKALA SMALL-
MEDIUM DENGAN METODE USE CASE
POINT (UCP)

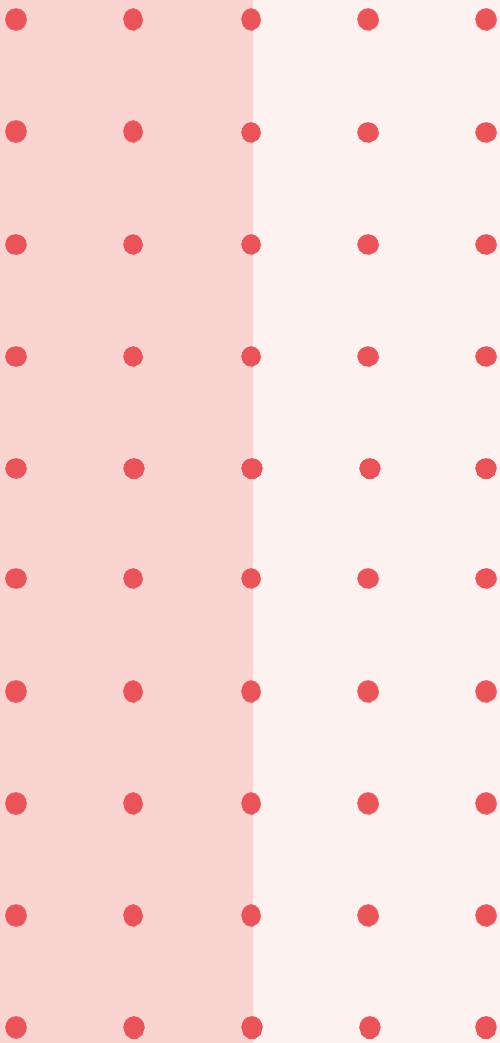

Thanks!

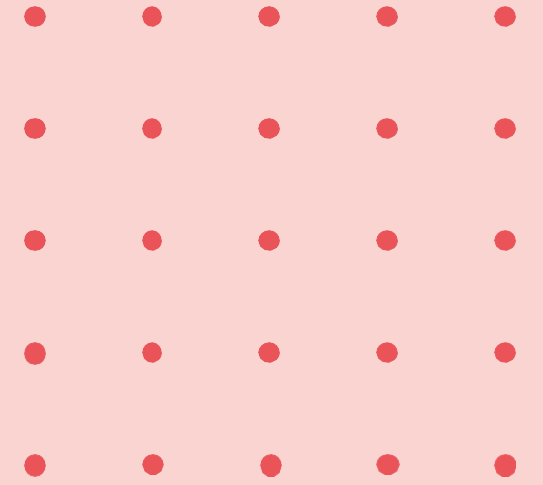

Do you have any
questions?
